



REGIONALNI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE
TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD



SKUPŠTINA DRUŠTVA

**REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE
OTPADOM - ŠAGULJE d.o.o.**
35 000 SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 26A

KLASA: 024-01/26-1/02
URBROJ: 2178/1-33-26-2
Slavonski Brod, 05. lipnja 2026. godine

Temeljem članka 20. Društvenog ugovora, Skupština Društva RCGO-ŠAGULJE d.o.o., na sjednici održanoj 05. lipnja 2026. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća o radu RCGO ŠAGULJE d.o.o. za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2025. godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Brodsko-posavska županija
- Požeško-slavonska županija
- Sisačko-moslavačka županija
- RCGO Šagulje d.o.o.
- Pismohrana

Predsjednik Skupštine
Dr. sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.

ŠAGULJE
d.o.o.
TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD

**REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE
OTPADOM - ŠAGULJE d.o.o.**

35 000 SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 26A

KLASA: 024-02/26-1/02

URBROJ: 2178-01-33-26-2

Slavonski Brod, 22. svibnja 2026. godine

Na temelju odredbi čl.4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o., članovi Nadzornog odbora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. na svojoj sjednici održanoj dana 22.05.2026. godine donijeli su sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o radu RCGO-ŠAGULJE d.o.o. za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2025. godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora

Olivera Maglić, dipl.ing.stroj

Dostaviti:

- Članovima Nadzornog odbora
- Josip Grgić, predsjednik Uprave
- Arhiva
- Računovodstvo RCGO Šagulje d.o.o.



REGIONALNI CENTAR
GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE
d.o.o.
TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD

IZVJEŠĆE O RADU REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o. ZA 2025. GODINU



Slavonski Brod, travanj 2026.

Sadržaj

1. UVOD	3
2. REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE	4
3. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2025. GODINI	5
3.1. PROVEDBA PROJEKATA RCGO ŠAGULJE	5
3.2. OSTALE AKTIVNOSTI	7
3.3. NATURALNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA	7
4. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2025. GODINU	10
4.1. BILANCA	11
4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	12
5. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI	13

1. UVOD

Trgovačko društvo **REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE d.o.o.** je regionalna komunalna tvrtka (u daljnjem tekstu: Društvo, RCGO) sa sjedištem u Slavonskom Brodu, osnovana s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradiški. U vlasništvu je triju županija, i to: Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke (24,5%).

Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke te Virovitičko-podravске županije, sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Tvrtka: Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o.

Skraćena tvrtka: RCGO Šagulje d.o.o.

Sjedište: Slavonski Brod, Trg pobjede 26a

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću


Organi Društva: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava Društva

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva: predsjednik Uprave Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

Zaposlenici: na kraju 2025. godine Društvo je imalo 5 zaposlenih.

Obuhvat RCGO Šagulje prostire se na četiri županije, i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Virovitičko-podravsku županiju, a prema popisu stanovništva iz 2021. godine, prema RCGO Šagulje gravitirat će 392.937 stanovnika.

Slika 1: Obuhvat RCGO Šagulje

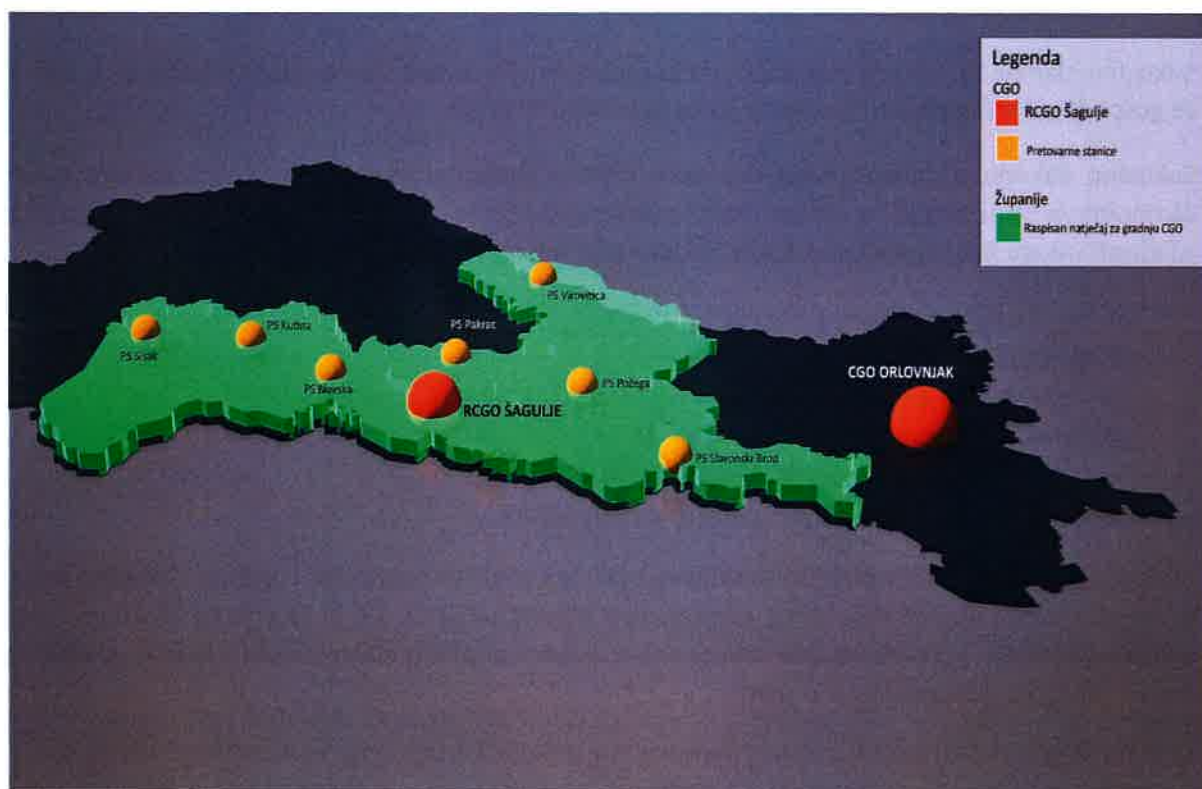

2. REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE

Osnovna djelatnost RCGO Šagulje d.o.o. je, prema NKD klasifikaciji, gospodarenje otpadom.

Projekt RCGO Šagulje uključuje projektiranje i izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje i izgradnju sedam pretovarnih stanica.

Za potrebe Projekta izrađena je Studija izvedivosti s analizom varijantnih rješenja za odabir optimalnog rješenja sakupljanja otpada, tokova otpada i obrade otpada prije odlaganja.

Lokacija RCGO Šagulje je na području grada Nove Gradiške, katastarske općine Kovačevac i Mašić. Zemljište za gradnju darovala je Republika Hrvatska.

Sastavni dio RCGO Šagulje su i sedam pretovarnih stanica od čega je jedna u Brodsko-posavskoj županiji (PS Slavonski Brod), dvije u Požeško-slavonskoj županiji (PS Požega i PS Pakrac), dvije u Sisačko-moslavačkoj županiji (PS Kutina i PS Novska) i jedna u Virovitičko-podravskoj županiji (PS Virovitica).

Pretovarne stanice predstavljaju dislocirani ulaz u RCGO, na kojem se zaprima otpad sakupljen na udaljenim lokacijama unutar obuhvata Centra te se vozilima većeg kapaciteta prevozi na obradu u RCGO.

Centar je dimenzioniran za obradu do 55.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje.

Glavni tehnološki procesi u RCGO Šagulje su:

- Mehaničko-biološka obrada ostatnog miješanog komunalnog otpada
- Biološka obrada odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada
- Mehanička obrada građevnog otpada
- Mehanička obrada glomaznog otpada
- Odlagalište otpada (odlagalište neopasnog otpada i odlagalište inertnog otpada)
- Fotonaponska elektrana

Sukladno članku 10. Zakona o gospodarenju otpadom, gospodarenje otpadom i građenje građevina za gospodarenje otpadom od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Planu gospodarenja otpadom RH, jedinice lokalne samouprave su u obvezi, u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (čl. 64. Zakona), osigurati uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

1. miješanog komunalnog otpada
2. biootpada
3. reciklabilnog komunalnog otpada i
4. glomaznog otpada jednom godišnje te
 - uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu
 - uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

CGO je, prije svega, postrojenje za obradu miješanog komunalnog otpada i njegova zakonska obveza je preuzimanje i obrada miješanog komunalnog otpada (ZGO čl. 13. st.3) dok su za druge tokove otpada zadužene jedinice lokalne samouprave (papir, plastika, staklo, metal, tekstil, građevinski otpad, odvojeno prikupljeni biootpad).

CGO može prihvaćati, osim miješanog komunalnog otpada, i druge vrste komunalnog otpada, što je potrebno regulirati sporazumom (čl. 13. ZGO).

3. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2025. GODINI

3.1. Provedba projekata RCGO Šagulje

Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje

U tijeku je provedba Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost – za projekt: „Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje“

Bespovratna sredstva za projekt izgradnje pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje ishođena su u prosincu 2024. godine iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.855.602,56 eur, a dodijeljena su bespovratna sredstva u visini 70% prihvatljivih troškova projekta iz sredstava NPOO te u visini 15% prihvatljivih troškova projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Preostalih 15% vrijednosti projekta snosi RCGO Šagulje.

U lipnju 2025. godine započela je izgradnja pet pretovarnih stanica, i to: pretovarna stanica Slavonski Brod, pretovarna stanica Kutina, pretovarna stanica Novska, pretovarna stanica Požega i pretovarna stanica Pakrac.

U tijeku su radovi na izgradnji navedenih pretovarnih stanica a završetak radova planiran je do rujna 2026. godine.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije

Sva projektna dokumentacija potrebna za prijavu na EU sufinanciranje kojim će se financirati izgradnja centralnog prostora za obradu otpada je izrađena i spremna za raspisivanje javnog natječaja za nabavu usluga, opreme i radova potrebnih za realizaciju navedenog projekta prema FIDIC žutoj knjizi (prema kojoj je obveza Izvođača izrada glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje građevinskih dozvola).

Završena je Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi te čeka konačno odobrenje JASPERS.

Na 128. sjednici Vlade Republike Hrvatske, dana 20.11.2025. godine, donesena je Odluka o modelu financiranja novih projekata izgradnje Centara za gospodarenje otpadom u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i drugih instrumenata Europske unije.

Na temelju navedene Odluke, raspisat će se javni poziv za financiranje izgradnje Centara obuhvaćenih modelom (Šagulje i Orlovnjak).

Izrađen je Program dodjele državnih potpora za ulaganja u infrastrukturu centara za gospodarenje otpadom u obliku naknade za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa na temelju kojeg će se dodjeljivati sredstva za izgradnju RCGO Šagulje.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje izgradnje i opremanja RCGO Šagulje očekuje se sredinom 2026. godine.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju šest pretovarnih stanica na području RCGO Šagulje potrebne za sufinanciranje sredstvima EU

Završena je i izrađena projektna dokumentacija za pet pretovarnih stanica koje su trenutno u izgradnji. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za pretovarnu stanicu Požega, pretovarnu stanicu Kutina i pretovarnu stanicu Sisak, dok su za ostale (Slavonski Brod, Novska, Pakrac, Virovitica) riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Za pretovarnu stanicu Virovitica ishođena je građevinska dozvola te je u tijeku izrada izvedbenog projekta.

Za pretovarnu stanicu Sisak u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi s Gradom Siskom te preostaje još sklapanje ugovora s tvrtkom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za izgradnju RCGO Šagulje i pretovarnih stanica

Sva potrebna Dokumentacija o nabavi je izrađena i spremna za objavu javnih natječaja za gradnju i opremanje RCGO Šagulje.

Provodit će se slijedeći postupci nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi:

- Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Šagulje;
- Pružanje usluga tehničke pomoći i/ili upravljanja projektom;
- Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji RCGO Šagulje;
- Promidžba i vidljivost projekta Izgradnja i opremanje RCGO Šagulje;
- Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica (Sisak, Virovitica);
- Nabava opreme (uključujući vozila za prijevoz otpada od pretovarnih stanica do RCGO Šagulje;
- Nabava radova izgradnje odlagališta za neopasni otpad i odlagališta za inertni otpad.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju odlagališta neopasnog i inertnog otpada

Obzirom da financiranje izrade projektne dokumentacije za odlagališta neopasnog i inertnog otpada nije bilo EU prihvatljiv trošak, RCGO Šagulje je osiguralo sredstva za navedeno financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije dodijelio je Fond u 100% iznosu od 200.000 EUR.

Dana 03.02.2025. godine ishođene su građevinske dozvole za odlagalište inertnog otpada i odlagalište neopasnog otpada te je izrađena i dokumentacija o nabavi radova izgradnje.

Izgradnja odlagališta neopasnog i inertnog otpada sastavni je dio projekta izgradnje i opremanja RCGO Šagulje.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu

U mjesecu kolovozu 2022. godine RCGO Šagulje se prijavilo na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije u vrijednosti 201.075,05 eur. Financiranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije iznosi 90%.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopljen je dana 21.07.2023. godine.

Sklopljeni su Ugovori za izradu projektno – tehničke dokumentacije u tri grupe, i to:

- Grupa 1: Izrada idejnog i glavnog projekta
- Grupa 2: Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
- Grupa 3: Izrada Dokumentacije o nabavi.

Do kraja listopada 2025. godine ishođene su Potvrde na glavni projekt te je izrađena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi i Dokumentacija o nabavi radova izgradnje fotonaponske elektrane RCGO Šagulje.

Dokumentacija je spremna za prijavu na budući poziv na dodjelu sredstava za financiranje izgradnje fotonaponske elektrane.

Fotonaponska elektrana projektirana je na priključnu snagu od 3 MW a koja će služiti za potrebe napajanja Centra električnom energijom.

3.2. Ostale aktivnosti

Tijekom izvještajnog razdoblja, Projektni tim RCGO Šagulje sudjelovao je u radu Grupacije Centara za gospodarenje otpadom kroz davanje komentara na prijedloge izmjena zakonske regulative. Održavani su redoviti sastanci s resornim Ministarstvom i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Projektni tim također je surađivao s jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu RCGO Šagulje prilikom izrade izmjena Prostornih planova istih, izrade Planova gospodarenja otpadom te izrade Programa odvojeno prikupljenih vrsta otpada.

Održano je pet sjednica Skupštine Društva te pet sjednica Nadzornog odbora.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Društvo je obvezno odgovarati na upite građana i rješavati pristigle zahtjeve za određenim informacijama u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

U 2025. godini Društvo nije zaprimilo niti jedan zahtjev za pristup informacijama.

3.3. Naturalni pokazatelji uspješnosti poslovanja

Društvo je poslovne ciljeve za 2025. godinu odredilo Planom rada Društva za 2025. godinu koji je prihvaćen od strane Nadzornog odbora na sjednici održanoj 24. listopada 2024. godine, a koji je izrađen sukladno smjernicama za rad RCGO Šagulje, donesenima na 21. sjednici Skupštine Društva održanoj 15. listopada 2024. godine.

Imajući u vidu cilj osnivanja Društva – uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom sa svrhom doprinosa zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, a koji podrazumijeva izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i sedam pretovarnih stanica, definirani su slijedeći ciljevi za 2025. godinu.

U nastavku se daje tabelarni prikaz utvrđenih i ostvarenih ciljeva u 2025. godini:

Tablica 1: Utvrđeni i ostvareni ciljevi RCGO Šagulje za 2025. godinu

CILJ 1.: OSIGURANJE FINACIJSKIH SREDSTAVA I PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Odobrenje novelirane studije izvedivosti od strane JASPERS	Novelirana Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi, novelirana Projektna prijava, predane završne verzije na konačnu ocjenu.	U TIJEKU
Sklapanje novog ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava	Na 128. sjednici Vlade Republike Hrvatske, dana 20.11.2025. godine, donesena je Odluka o modelu financiranja novih projekata izgradnje Centara za gospodarenje otpadom u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i drugih instrumenata Europske unije. Izrađen Program dodjele državnih potpora za ulaganja u infrastrukturu centara za gospodarenje otpadom u obliku naknade za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa na temelju kojeg će se dodjelivati sredstva za izgradnju RCGO Šagulje.	U TIJEKU
Sklapanje ugovora o davanju kapitalne pomoći FZOEU	Po sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava pristupit će se sklapanju ugovora o davanju kapitalne pomoći s FZOEU	U PRIPREMI
Provođenje postupaka javne nabave	Sva potrebna Dokumentacija o nabavi je izrađena i spremna za objavu javnih natječaja za gradnju i opremanje RCGO Šagulje.	U PRIPREMI
CILJ 2.: REALIZACIJA PROJEKTA IZGRADNJE PRETOVARNIH STANICA U OBUHVATU RCGO ŠAGULJE		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Izgradnja pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje	Izgradnja pet pretovarnih stanica (Slavonski Brod, Požega, Pakrac, Kutina, Novska) započela je u lipnju 2025. godine.	U TIJEKU
Provođenje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje	Usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje započela je u lipnju 2025. godine.	U TIJEKU
Provođenje usluga voditelja projekta „Izgradnja pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje“	Usluga voditelja projekta „Izgradnja pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje“ započela je u lipnju 2025. godine.	U TIJEKU
Praćenje i administriranje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt: „Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje“ sklopljen je dana 28.01.2025. godine te je istodobno započela i realizacija istoga.	U TIJEKU
CILJ 3.: REALIZACIJA PROJEKTA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA FOTONAPONSKU ELEKTRANU ZA RCGO ŠAGULJE		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Izrada idejnog i glavnog projekta	U veljači 2025. godine izrađeni i dostavljeni Idejni i Glavni projekt	DOVRŠENO
Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi	U svibnju 2025. godine izrađena i dostavljena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi	DOVRŠENO

Izrada Dokumentacije o nabavi	U lipnju 2025. godine izrađena i dostavljena Dokumentacija o nabavi	DOVRŠENO
Praćenje i administriranje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava završio je 25.09.2025. Dana 25.08.2025. upućen je Završni zahtjev za nadoknadom sredstava koji je ocijenjen prihvatljivim. Ukupno isplaćena bespovratna sredstva po ovom Ugovoru iznosila su: 100.409,88 eura što je 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta.	DOVRŠENO

CILJ 4.: RIJEŠENI IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
RCGO ŠAGULJE	10.03.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora. Ugovor o darovanju zemljišta u k.o. Lpvačevac i k.o. Mašić dostavljen na potpis 16.01.2026. godine, a potpisan od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dana 23.03.2026. godine	DOVRŠENO
PRETOVARNA STANICA SLAVONSKI BROD	7.4.2023. predan zahtjev za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. 5.10.2023. poslana molba za žurnim donošenjem odluke na podneseni zahtjev. Ugovor o osnivanju prava građenja potpisan 8.5.2024.	DOVRŠENO
PRETOVARNA STANICA POŽEGA	10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.	U TIJEKU
PRETOVARNA STANICA PAKRAC	10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Ugovor o pravu građenja potpisan 12.12.2023. s Ministarstvom poljoprivrede	DOVRŠENO
PRETOVARNA STANICA KUTINA	Za 5 od 7 katastarskih čestica u vlasništvu komunalnog društva Eko-Moslavine Ugovor o pravu građenja potpisan 18.01.2023. Za 2 od 7 katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske 7.4.2023. predan zahtjev za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Zahtjev uredan i kompletiran. Čeka se odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.	U TIJEKU
PRETOVARNA STANICA NOVSKA	10.3.2023. predani zahtjevi za sklapanjem Ugovora o pravu građenja. Ugovor o pravu građenja potpisan 01.12.2023. s Ministarstvom poljoprivrede	DOVRŠENO
PRETOVARNA STANICA SISAK	Sklopljen ugovor s Gradom Siskom, potrebno je još sklopiti ugovor s tvrtkom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.	U TIJEKU
PRETOVARNA STANICA VIROVITICA	Ugovor o osnivanju prava građenja s Gradom Virovitica sklopljen dana 29.04.2025.	DOVRŠENO

4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2025. GODINU

U 2025. godini potrošeno je 2.017.636,32 eura europskih sredstava.

Ukupni prihodi RCGO Šagulje d.o.o. u 2025. godini iznose 304.048,60 eur te su u odnosu na 2024. godinu povećani za 74.669,15 eur, ili u postotku 32,55%.

Ukupni rashodi RCGO Šagulje d.o.o. u 2025. godini iznose 302.015,07 eur, dok su u 2024. godini iznosili 229.075,09 eur, što je povećanje od 31,84%.

Rezultat poslovanja prije oporezivanja dobiven je oduzimanjem ukupnih rashoda od ukupnih prihoda, tako da rezultat RCGO Šagulje prije oporezivanja u 2025. godini iznosi 2.033,53 eur. Pozitivna razlika prihoda i rashoda razdoblja predstavlja ostvarenu dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.033,53 eur.

U usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je povećanje dobiti prije oporezivanja za 1.729,17 eur, ili 568,13%.

Obveza poreza na dobit utvrđuje se u skladu s važećim odredbama Zakona o porezu na dobit koja se primjenjuje na 2025. poslovnu godinu i utječe na rezultat poslovanja financijske godine.

Društvo je na osnovicu od 2.033,53 eur obračunalo porez na dobit po pripadajućoj stopi prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Porez na dobit:
iznosi 599,49 eur

Poslovni rezultat:
iznosi 1.434,04 eur

4.1. Bilanca

Ukupna vrijednost aktive na kraju 2025. godine iznosila je 6.384.606,40 eur, te bilježi promjenu u odnosu na 2024. godinu od 2,36 puta, odnosno za 3.681.520,36 eur.

Pasiva Društva sastoji se od ukupnog kapitala i rezervi, rezerviranja, dugoročnih i kratkoročnih obveza te odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja.

Ukupni kapital i rezerve Društva na kraju 2025. godine iznose 1.355.569,99 eur, što je u odnosu na 2024. godinu povećanje od 36,63%.

U nastavku u tablici se daje pregled bilance za 2025. godinu u usporedbi sa 2024. godinom.

Tablica 2: Bilanca na dan 31.12.2025.

(svi iznosi izraženi su u eurima)

STAVKA	BILJEŠKA	2024	2025
IMOVINA			
Dugotrajna imovina		2.513.369,91	5.843.870,42
Materijalna imovina		2.513.369,91	5.843.870,42
Kratkotrajna imovina		189.716,13	540.735,98
Potraživanja		27.549,92	11.834,87
Novac u banci i blagajni		155.316,73	521.261,63
UKUPNO AKTIVA		2.703.086,04	6.384.606,40
KAPITAL I REZERVE			
Upisani kapital		5.202,73	5.202,73
Kapitalne rezerve		985.133,73	1.347.099,24
Zadržana dobit		1.833,97	1.833,98
Dobit / (gubitak) poslovne godine		0,01	1.434,04
Ukupno kapital		992.170,44	1.355.569,99
Kratkoročne obveze			
Obveze za predujmove		245.451,10	311.845,21
Obveze prema dobavljačima		49.687,38	340.356,34
Obveze prema zaposlenicima		8.376,47	9.750,14
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		4.369,44	5.648,56
Ostale kratkoročne obveze		18.698,65	15.743,91
Ukupne kratkoročne obveze		326.583,04	683.344,16
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja		1.384.332,56	4.345.692,25
UKUPNO PASIVA		2.703.086,04	6.384.606,40

4.2. Račun dobiti i gubitka

Tablica 3: Ostvareni financijski rezultati u 2025. godini s ocjenom poslovanja u odnosu na 2024. godinu

(svi iznosi izraženi su u eurima)

RB	Pozicija	2024	2025	Indeks
1	2	3	4	$5((4-3)/3 \times 100)$
1	Poslovni prihodi	229.361,13	302.004,55	32,00
2	Poslovni rashodi	229.075,09	299.941,44	24,00
3	Financijski prihodi	18,32	2.044,05	11.058,00
4	Financijski rashodi	0	2.073,63	-
5	Ukupni prihodi (1+3)	229.379,45	304.048,60	33,00
6	Ukupni rashodi (2+4)	229.075,09	302.015,07	32,00
7	Dobit prije oporezivanja (5-6)	304,36	2.033,53	569,00
8	Porez na dobit	304,35	599,49	97,00
9	Neto dobit tekuće godine (7-8)	0,01	1.434,04	

U 2025. godini uplate Osnivača za financiranje redovitog poslovanja iznosile su ukupno 359.772,80 eur, od čega:

- Brodsko-posavska županija = 183.025,12 eur
- Požeško-slavonska županija = 88.373,84 eur
- Sisačko-moslavačka županija = 88.373,84 eur.

Uplate Osnivača za financiranje vlastitog učešća u financiranju projekta: „Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje“ u 2025. godini iznosile su ukupno 403.506,31 eur, od čega:

- Brodsko-posavska županija = 205.788,21 eur
- Požeško-slavonska županija = 98.859,05 eur
- Sisačko-moslavačka županija = 98.859,05 eur.

Dug Požeško-slavonske županije od 26.08.2024. godine za financiranje III. rate troškova priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu iznosi: 87.308,38 eur.

5. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

Cilj 1: Osiguranje sredstava za realizaciju projekta i provođenje postupaka javne nabave:

- Ishođenje Odluke o financiranju i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava iz PKK 2021.-2027.
- Sklapanje Ugovora o davanju sredstava kapitalne pomoći FZOEU
- Sklapanje Ugovora o kreditiranju vlastitog učešća u projektu
- Provođenje postupaka javne nabave za radove i popratne usluge na izgradnji RCGO Šagulje i preostale dvije pretovarne stanice (Sisak i Virovitica)
- Provođenje postupaka javne nabave za radove i popratne usluge na izgradnji odlagališta neopasnog i inertnog otpada

Cilj 2: Realizacija projekta izgradnje RCGO Šagulje


- Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje
- Provođenje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje
- Provođenje usluga voditelja projekta „Izgradnja pretovarnih stanica u obuhvatu RCGO Šagulje“
- Praćenje i administriranje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO
- Ishođenje Uporabnih dozvola za izgrađene građevine
- Ugovaranje i početak radova izgradnje RCGO Šagulje i 2 pretovarne stanice (Sisak i Virovitica)
- Ugovaranje i početak radova izgradnje odlagališta neopasnog i inertnog otpada

Cilj 3: Riješeni imovinsko-pravni odnosi

- RCGO Šagulje
- Pretovarna stanica Požega
- Pretovarna stanica Kutina
- Pretovarna stanica Sisak

Ostale aktivnosti:

- Implementacija i priprema za certifikaciju integriranih sustava upravljanja (upravljanje dokumentacijom, sustav zaštite okoliša, sustav zaštite za radu – ISO 9001, 14001);
- Kontinuirana suradnja i dogovori s jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima o svim aktivnostima vezanim uz gospodarenje otpadom;
- Organizacija redovnih Skupština Društva
- Izrada i usvajanje Plana rada i Financijskog plana te Izvješća o radu
- Informiranje putem web stranice o svim relevantnim događajima u svezi s uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te događajima vezanim uz provođenje projekata
- Provedba edukativno-informativnih aktivnosti o Projektima i sustavu gospodarenja otpadom
- Sudjelovanje u radu i vođenje Grupacije centara za gospodarenje otpadom
- kontinuirana edukacija i usavršavanje znanja i vještina u području gospodarenja otpadom

Predsjednik Uprave
Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

REGIONALNI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE
d.o.o.
TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD
